

令和5年度（令和4年度施工）優良工事

工 事 名	道外第1号 新井総合公園陸上競技場改修工事			
施 工 場 所	妙高市 新井 地内	請負金額	123,750,000円	
受 賞 会 社	岡田土工工業(株)			
優 秀 技 術 者	現場代理人	筒井 冬樹	監理技術者	筒井 冬樹
工 事 概 要	陸上競技場改修 ウレタン切削オーバーレイ A = 4, 290 m <sup>2</sup> ウレタン洗浄 A = 3, 300 m <sup>2</sup> 内圏縁石補修 L = 378 m                              砲丸投げ落下区域整備 A = 181 m <sup>2</sup>			
選 定 理 由	本工事は、経年劣化等による走路面及び競技施設を改修する工事である。雨天時には走路面の施工ができないなど、制約が厳しい現場条件であったが、適切な工程管理による工期短縮を図り、10月末までに無事故で工事を完成させた。また、出来形管理や品質管理においても優れており、完成書類も見やすく整理されていたことから、他の模範となる工事であることを評価した。			



工 事 名	道改第2号 市道赤倉温泉16号線道路改良工事			
施 工 場 所	妙高市 赤倉 地内	請負金額	29,988,200円	
受 賞 会 社	(株)野本組			
優 秀 技 術 者	現場代理人	小山 隆雄	主任技術者	小山 隆雄
工 事 概 要	道路改良 L = 239.0 m W = 4.00 m (5.00 m) 側溝工 (自由勾配側溝) L = 488 m      防護柵工 (ガードレール) L = 6.9 m 舗装工 (アスファルト舗装・コンクリート舗装) A = 1, 227 m <sup>2</sup>			
選 定 理 由	本工事は、急勾配な現況の市道を拡幅する道路改良工事である。工事現場は、観光地であることから来訪者が多く、制約が多い厳しい現場条件であったにもかかわらず、地元関係者と綿密に協議し、適切な工程管理と安全対策を行い、無事故で工事を完成させた。また、出来形管理に新技術の遠隔サポートシステムやデキスパートなどを活用することで、施工管理にも優れ、完成書類も見やすく整理されていたことを評価した。			



工 事 名	交雪第3号 市道白山町運動公園線他消雪パイプ更新工事			
施 工 場 所	妙高市 白山町 地内	請負金額	39,138,000円	
受 賞 会 社	岡田土建工業(株)			
優 秀 技 術 者	現場代理人	白崎 智也	主任技術者	白崎 智也
工 事 概 要	消雪パイプ更新 L = 542 m 取水施設工 消雪用井戸ポンプφ125×30kw N = 1基 送水・散水管工 φ125～65mm L = 542 m			
選 定 理 由	本工事は、保育園や小学校などの公共施設が建ち並ぶ文教地区での消雪パイプ工事である。安全対策を適切に行い、無事故で工事を完成させた。また、施工体制、施工管理が会社全体で組織的に取り組まれており、全体的な美観が良いことなど、工事の品質、出来ばえが、良好であったことを評価した。			




工 事 名	交雪第5号 市道仲町東線他消雪用井戸更新工事			
施 工 場 所	妙高市 関山 地内	請負金額	47,550,800円	
受 賞 会 社	岡田土建工業(株)			
優 秀 技 術 者	現場代理人	小島 誠治	主任技術者	小島 誠治
工 事 概 要	消雪用井戸更新 H=170m 1本 さく井工 掘削口径 φ444.5mm (ロータリー工法) 掘削深度 H=168.2m			
選 定 理 由	本工事は、小学校が近接する通学路、集落内道路での消雪用井戸の更新工事である。児童や歩行者が工事区間内を安全に通行できるよう、誘導看板の設置や交通誘導員の配置など、安全対策を適切に行い、無事故で工事を完成させた。また、施工体制、施工管理が会社全体で組織的に取り組まれており、工事の品質、出来ばえが、良好であったことを評価した。			



工 事 名	妙建第1号 妙高支所・妙高保健センター施設改修・建築工事		
施 工 場 所	妙高市 関山 地内	請負金額	139,417,300円
受 賞 会 社	(株)保坂組		
優秀技術者	現場代理人 堀井 永久	主任技術者	堀井 永久
工 事 概 要	屋上防水改修工事 1式	外壁改修工事	1式
	エレベーター改修工事 1式	内部改修工事	1式
選 定 理 由	<p>本工事は、利用者が多い庁舎等の使用を継続しつつ、複数の改修を実施した工事である。</p> <p>施設管理者や発注者と綿密な調整を図り、施設運営に十分配慮のうえ、安全確保及び品質確保に努め、効率的な工程管理により工期内に無事工事を完成させたことを評価した。</p>		



工 事 名	妙建第2号 妙高支所・妙高保健センター施設改修・電気設備工事		
施 工 場 所	妙高市 関山 地内	請負金額	65,428,000円
受 賞 会 社	西脇・野口・東北新井電気特定共同企業体		
	代表構成員 (株)西脇電気商会	構成員 (株)野口電気	構成員 東北新井電気(株)
優秀技術者	現場代理人 池田 浩 (株)西脇電気商会	主任技術者	池田 浩 (株)西脇電気商会 鈴木 晃 (株)野口電気) 田中敏浩 (東北新井電気(株))
工 事 概 要	1.幹線・動力設備 1式	2.電灯設備 1式	3.コンセント・空調機電源設備 1式
	4.非常用照明設備 1式	5.呼出し設備 1式	6.防災盤改修 1式
	7.昇降機改修工事 1式	8.発生材処理 1式	
選 定 理 由	<p>本工事は、利用者が多い庁舎等の使用を継続しつつ、複数の改修を実施した工事である。</p> <p>施設管理者や発注者と綿密な調整を図り、施設運営に十分配慮のうえ、安全確保及び品質確保に努め、効率的な工程管理により工期内に無事工事を完成させたことを評価した。</p>		

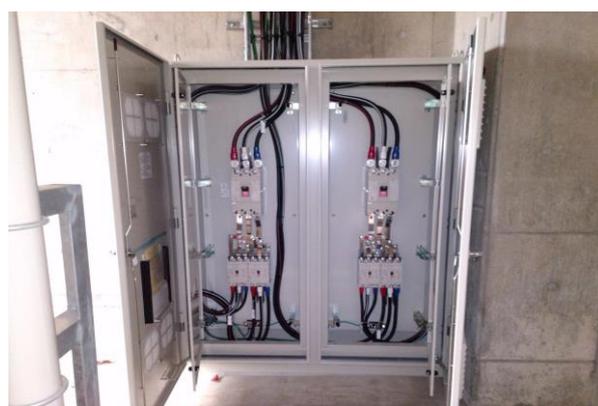

工 事 名	妙建第3号 妙高支所・妙高保健センター施設改修・機械設備工事		
施 工 場 所	妙高市 関山 地内	請負金額	84,370,000円
受 賞 会 社	セイコースミダ・中電産業特定共同企業体 代表構成員 (株)セイコースミダ 構成員 中電産業(株)		
優 秀 技 術 者	現場代理人	細井 広道 (株)セイコースミダ	主任技術者 細井 広道 (株)セイコースミダ
工 事 概 要	1.衛生設備工事 1-1.衛生器具設備 1式 1-2.給水設備工事 1式 1-3.撤去工事 1式 2.空調設備工事 2-1.空調機器設備 1式 2-2.配管工事 1式 2-3.ダクト工事 1式 2-4.撤去工事 1式		
選 定 理 由	本工事は、利用者が多い庁舎等の使用を継続しつつ、複数の改修を実施した工事である。 施設管理者や発注者と綿密な調整を図り、施設運営に十分配慮のうえ、安全確保及び品質確保に努め、効率的な工程管理により工期内に無事工事を完成させたことを評価した。		

